

## 2013 年度夏祭り計画のための体制案と日程計画案


2012 年度夏祭りは地域自治協議会による最初のイベントであったが、旧来の体制を継承する形で、実行委員会と会場設営・模擬店運営・イベント運営の3小委員会体制とした。

2012 年度、実行委員会の結論に対し理事会で異論が出て度々混乱したこと、終了後の反省会で多数問題点を指摘されたことは、理事会と夏祭り実行委員会の職掌範囲が不明瞭だったことが一因といえる。その轍を踏まないため、早い時期の体制作りと日程計画が肝要。

2013年度夏祭りについては、全理事参加の実行委員会が理事会の前に計画を詳細に議論し、理事会は、その議論に基づく夏祭り計画の大綱と予算計画を審議、承認するものとする。  
小委員会(前年と同じ)は、理事会が決定した範囲の具体的計画の検討・準備・実行を行う。

この体制案と正副実行委員長の選任につき審議いただくとともに、3小委員会の委員長選任を実行委員長に一任することを承認いただきたい。

### 1. 夏祭り実行委員会の体制と協議会理事会

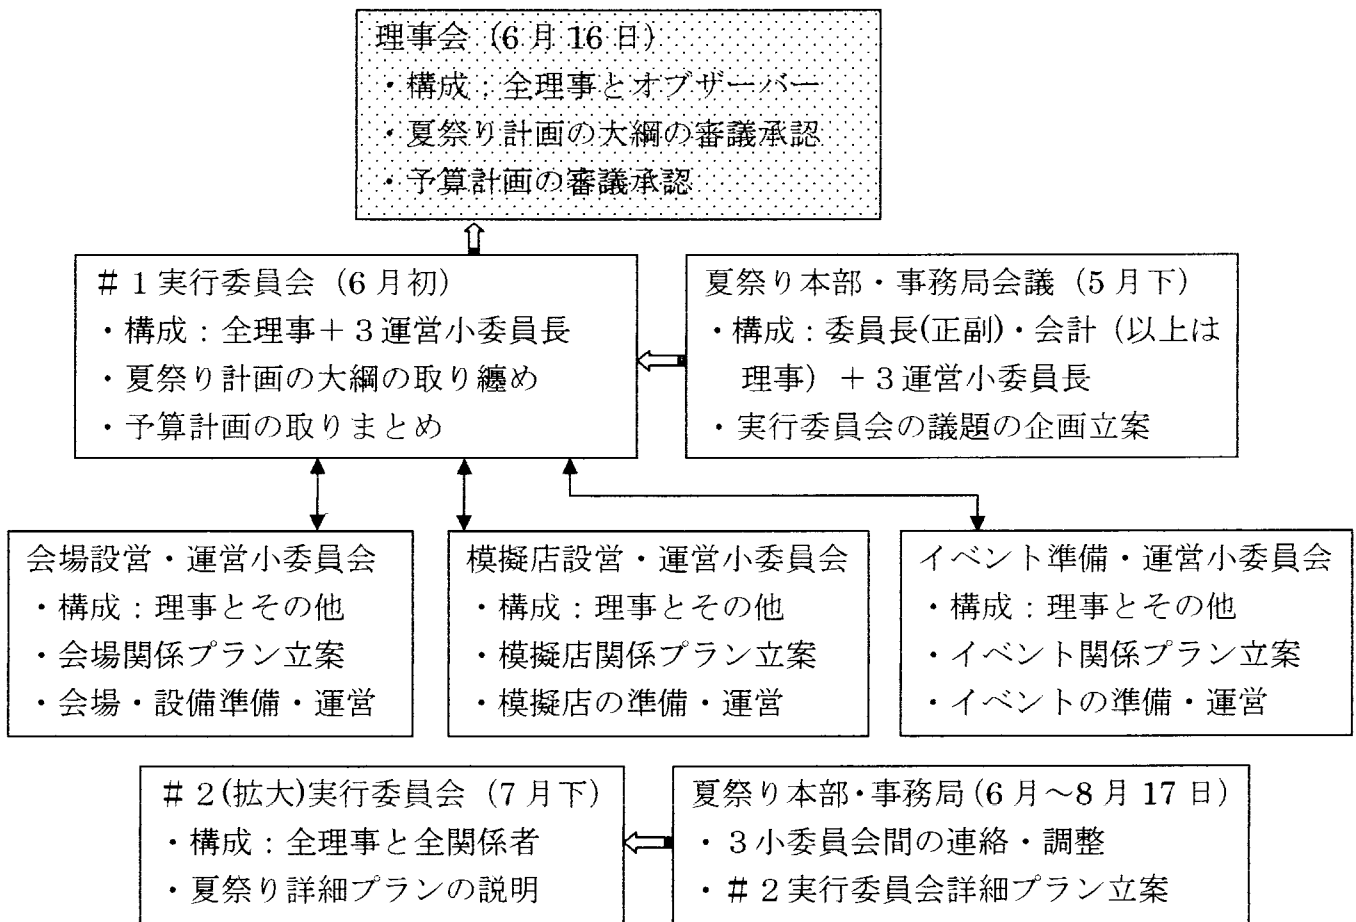

### 2. 夏祭り開催準備日程

- 5月19日 夏祭り実行委員会の体制の承認及び正副委員長・会計を理事の中から選任。
- 5月下 本部・事務局会議にて今年の夏祭りの内容見直し検討。実行計画案の立案。
- 6月初 実行委員会は詳細計画と予算案の審議。6月 理事会にて審議、承認手続き。
- 7月下 拡大実行委員会開催、全関係者との意思疎通を図る。
- 8月17日 事前準備と前日準備、開催、後片付け。
- 9月2日 実行委員会反省会の開催 (拡大実行委員会メンバーにて)。
